
PROJETO FINAL · TRABALHANDO EM EQUIPE

Scrum na prática

Sprint, daily, tasks, board e review: como uma equipe de software organiza o trabalho

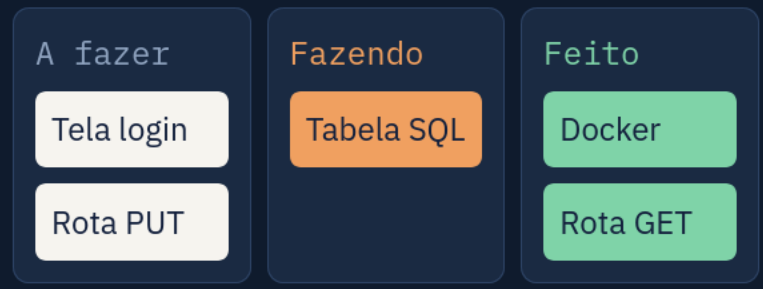

O PROBLEMA

Planejar tudo no início e entregar tudo no fim

⚠ CASCATA

Requisitos → Projeto → Código → Testes → Entrega

O cliente só vê o sistema no final. Se algo foi mal entendido, o erro aparece quando já não há tempo para corrigir.

✓ ÁGIL

Ciclos curtos, cada um termina com algo funcionando

O cliente vê o sistema a cada ciclo. Um erro de entendimento custa uma ou duas semanas, não o projeto inteiro.

A BASE DO SCRUM

Três pilares sustentam todo o resto

[icon: Eye]

Transparência

Todos veem o mesmo quadro: o que falta, o que está andando e o que travou.

[icon: MagnifyingGlass]

Inspeção

A equipe confere o progresso com frequência: todo dia e no fim de cada sprint.

[icon: ArrowsClockwise]

Adaptação

Achou um problema? Muda o plano cedo, em vez de seguir no caminho errado.

QUEM É QUEM

Três papéis, um só Scrum Team

[icon: Target]

Product Owner

Decide **o quê** fazer e em que ordem. Cuida do Product Backlog e fala pelo cliente.

[icon: Compass]

Scrum Master

Garante que o Scrum funcione. Remove impedimentos e protege a equipe. **Não é chefe.**

</>

Developers

Decidem **como** fazer e constroem o produto: código, banco, testes, telas.

Na nossa turma: cada equipe escolhe um **PO** e um **Scrum Master**, e todos programam.

VISÃO GERAL

O ciclo de uma sprint

1
Product Backlog
Lista de tudo que o produto precisa.

2
Sprint Planning
Escolhe o que entra e quebra em tasks.

3
Sprint + Daily
Trabalho no board, alinhamento diário.

4
Sprint Review
Mostra o incremento e colhe retorno.

5
Retrospectiva
Melhora o jeito de trabalhar.

[icon: ArrowsClockwise] Terminou a retrospectiva? **Começa a próxima sprint**, com o backlog atualizado.

ARTEFATO

Product Backlog: a fila de tudo que falta

#1	Cadastrar produto
#2	Listar produtos na tela
#3	Login de usuário
#4	Filtrar por categoria
#5	Exportar relatório em PDF

Ordenado

O mais importante fica no topo. Quem ordena é o PO.

Vivo

Itens entram, saem e mudam de lugar durante todo o projeto.

Detalhado no topo

Os primeiros itens são claros e pequenos. Os do fundo podem ser vagos.

ITEM DO BACKLOG

História de usuário e critérios de aceite

HISTÓRIA #1

Como funcionário do estoque,
quero cadastrar um produto,
para controlar o que temos à venda.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nome e preço são obrigatórios
- Preço não aceita valor negativo
- Após salvar, o produto aparece na lista

Quem · O quê · Por quê

Descreve a necessidade do usuário, não a solução técnica.

Critérios testáveis

Cada critério vira um teste: dá para responder “passou” ou “não passou”.

EVENTO

Sprint: um ciclo de duração fixa

1 a 4

semanas por sprint

A duração não muda no meio do caminho.

[icon: Flag] **Tem uma meta**

A Sprint Goal: uma frase que diz o objetivo do ciclo.

[icon: Package] **Termina com um incremento**

Algo que funciona e poderia ser usado, não “quase pronto”.

A meta é protegida

Nada entra na sprint se colocar a meta em risco.

EVENTO · INÍCIO DA SPRINT

Sprint Planning responde três perguntas

Por quê?

Definir a meta

Qual valor esta sprint vai entregar? Vira a Sprint Goal.

O quê?

Escolher os itens

Quais itens do topo do backlog cabem nesta sprint?

Como?

Quebrar em tasks

Cada item vira tarefas pequenas, de um dia ou menos.

O resultado é o **Sprint Backlog**: meta + itens escolhidos + plano de tasks.

TASKS

Uma história vira várias tarefas pequenas

HISTÓRIA #1

Cadastrar produto

Como funcionário do estoque, quero cadastrar um produto...

[icon: ArrowRight]

- Criar tabela produto
- Rota POST /produtos
- [icon: ShieldCheck] Validar nome e preço
- [icon: Browser] Formulário em Vue
- [icon: Plugs] Ligar tela à API
- [icon: TestTube] Testar no Api.http

Boa task: **cabe em um dia**, tem **um responsável** e dá para dizer se está feita.

BOARD

O quadro mostra a sprint inteira de uma vez

A fazer	Fazendo	Em revisão	Feito
Formulário em Vue —	Rota POST /produtos @ana	Testar no Api.http @bia	Criar tabela produto @ana
Ligar tela à API —	Validar nome e preço @léo		

Cada cartão é uma task. Ele anda **da esquerda para a direita** até chegar em Feito.

BOARD

Quatro regras para o quadro funcionar

1 Puxe, não empurre

Cada pessoa pega a próxima task quando termina a sua.

2 Uma task por vez

No máximo um ou dois cartões seus em “Fazendo”.

3 Atualize na hora

Começou ou terminou? Mova o cartão. Quadro velho engana.

4 Travou? Sinalize

Marque o cartão como bloqueado e avise a equipe.

EVENTO · TODO DIA

Daily: 15 minutos para alinhar a equipe

15

minutos, no máximo

Mesmo horário, mesmo lugar, em pé e na frente do board.

FORMATO MAIS COMUM: CADA UM RESPONDE

- O que eu fiz desde a última daily?
- O que vou fazer até a próxima?
- [icon: Prohibit] Tem algo me impedindo?

Não é relatório para o chefe: é a equipe **replanejando o dia** rumo à meta.

DEFINITION OF DONE

“Pronto” significa a mesma coisa para todos

[icon: CheckSquare]	Atende todos os critérios de aceite
[icon: CheckSquare]	docker compose build passa sem erro
[icon: CheckSquare]	Rotas testadas no Api.http
[icon: CheckSquare]	Um colega revisou o código
[icon: CheckSquare]	Commit feito e enviado para a branch principal

Vale para tudo

Critério de aceite é de cada história. A DoD vale para todas.

Sem “quase pronto”

Faltou um item? Não vai para Feito e não entra na review.

EVENTO · FIM DA SPRINT

Sprint Review: mostrar o que funciona e ouvir

[icon: Presentation]

Demonstrar

O sistema rodando de verdade, não slides sobre ele.

[icon: ChatsCircle]

Ouvir

Cliente e professor comentam, sugerem e corrigem o rumo.

[icon: ListChecks]

Ajustar o backlog

O retorno vira itens novos ou muda a ordem dos que existem.

Só entra o que cumpriu a **Definition of Done**. O que não terminou volta para o backlog.

EVENTO · FECHA A SPRINT

Retrospectiva: melhorar o jeito de trabalhar

Manter

O que funcionou bem? Ex.: tasks pequenas deixaram o board andar.

Melhorar

O que atrapalhou? Ex.: conflitos de merge no último dia.

Tentar

Uma ação concreta para a próxima sprint. Ex.: commit todo dia.

Review olha **o produto**. Retrospectiva olha **a equipe**. Sem culpados, só processo.

CUIDADO

Erros comuns de quem está começando

Em vez de...	Faça assim
Task “fazer o backend”	Tasks de até um dia cada
Daily de 40 minutos resolvendo bug	Cita o problema, resolve depois
Board atualizado só no dia da entrega	Move o cartão quando começa e termina
Cinco tasks em “Fazendo” por pessoa	Termina uma antes de pegar outra
Review com tela que “quase funciona”	Só mostra o que cumpre a DoD

NO PROJETO FINAL

Uma semana de sprint na nossa turma

1ª aula

Planning

Meta da semana, itens escolhidos e tasks no board.

Toda aula

Daily + trabalho

15 min na frente do board, depois mão no código.

Última aula

Review

10 min por equipe, sistema rodando, professor como cliente.

Última aula

Retrospectiva

Manter, melhorar, tentar. Uma ação para a próxima.

[icon: Kanban] Ferramenta do board: **GitHub Projects**, ligado às issues e pull requests do repositório.

RESUMO

Glossário de bolso

Product Backlog
Lista ordenada de tudo que o produto precisa.

Sprint Planning
Define meta, itens e tasks da sprint.

Board
Quadro com colunas que mostra o andamento.

Sprint Review
Mostra o incremento e ajusta o backlog.

Sprint
Ciclo fixo de 1 a 4 semanas com uma meta.

Task
Pedaço de trabalho de até um dia, com um responsável.

Daily
15 minutos diários para replanejar o dia.

Retrospectiva
Escolhe uma melhoria para a próxima sprint.
